インフラ長寿命化計画

令和５年度～令和 10 年度



播但連絡道路　福崎町内（福崎南Ｒ～福崎北Ｒ）


遠阪トンネル（丹波市側出入口）

令和５年 11 月

（令和８年 10 月一部改訂）

兵庫県道路公社

はじめに

兵庫県道路公社(以下、公社)が管理する播但連絡有料道路(以下、播但連絡道路)及び遠阪トンネル有料道路(以下、遠阪トンネル)は、兵庫県の基幹道路八連携軸を構成する一般有料道路(自動車専用道路)であり、但馬地域と、播磨・丹波地域を結び、「地域経済の活性化」、「交流の促進」、「渋滞解消」等に寄与するとともに、災害時の緊急輸送道路にも指定されるなど、安全・安心で豊かな暮らしを支える重要な基幹道路である。

播但連絡道路は、昭和48年に最初の区間(砥堀～福崎間)の開通後53年目を迎え、遠阪トンネルも、昭和52年の開通以来49年が経過しており、約６割の構造物が40年を経過するなど、経年劣化等による施設の損傷が顕在化している。このため、自動車専用道路に求められる管理水準を維持するための対策を進めていくことが喫緊の課題となっている。

これらを踏まえ、公社が管理する施設の維持管理・更新等を着実に推進するため、中期的な取組みの方向性を示す計画として、平成28年度に「兵庫県道路公社インフラ長寿命化計画(行動計画)」を策定した。それ以降も令和２年度(計画期間：Ｒ２～４)、及び令和５年度(計画期間：Ｒ５～８)にそれぞれ計画内容の見直しを行い、取り組みを進めてきた。

このたび、令和８年９月時点における法定点検・診断結果等を踏まえ、計画内容の見直しを行うとともに、計画期間を５年度ごとの法定点検サイクル(※)と整合させることとし、現計画の期間を令和５年から10年度の計画として改定を行うものである。

(※)１巡目：平成26～30年度、２巡目：令和元～５年度、３巡目：令和６～10年度

（目　次）

Ⅰ　計画の範囲 …… 3

１　路線の概要

２　対象施設

Ⅱ　対象施設の現状と課題 …… 5

Ⅲ　点検と結果 …… 6

１　点検・診断

２　主要構造物及び設備施設の点検計画

３　２巡目（Ｒ１～Ｒ５）及び３巡目（Ｒ６～Ｒ10）の点検結果

Ⅳ　計画の基本方針 …… 10

Ⅴ　個別施設の計画 …… 11

１　計画の進め方

２　個別施設計画

３　計画期間

Ⅵ　計画推進に当たっての留意事項 …… 12

１　社会的な理解を得るための情報提供

２　関係機関との連携

３　体制整備と技術者の育成、新技術の積極的導入

４　データベースの活用

Ⅶ　予算 …… 13

１　資金の確保

２　予算管理

Ⅷ　結びに …… 13

［個別施設計画］ …… 14

Ⅰ　計画の範囲


1　路線の概要

① 播但連絡道路（L=65.1km）

播但連絡道路は、播磨地域の中心都市である姫路市と、自然豊かで観光資源に富む但馬地域を結ぶ基幹道路で、国道312号の渋滞緩和を図り、住民福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的して、昭和45年より順次整備を進め、平成12年５月に全線が開通した。

【経　緯】

１期	砥堀・福崎区間（L=10.2km）	昭和48年11月１日　供用開始
	福崎・市川北区間（L=9.2km）	昭和50年11月１日　供用開始
２期	花田・砥堀区間（L=4.9km）	昭和56年１月13日　供用開始
	姫路JCT・花田区間（L=4.7km）	昭和60年12月７日　供用開始
	姫路JCT・砥堀区間４車線化（L=9.6km）	平成５年７月23日　供用開始
３期	市川北・神崎北区間（L=10.7km）	昭和57年９月28日　供用開始
４期	神崎北・生野北第２区間（L=8.2km）	平成４年３月26日　供用開始
５期	生野北第２・和田山区間（L=17.2km）	平成12年５月27日　供用開始

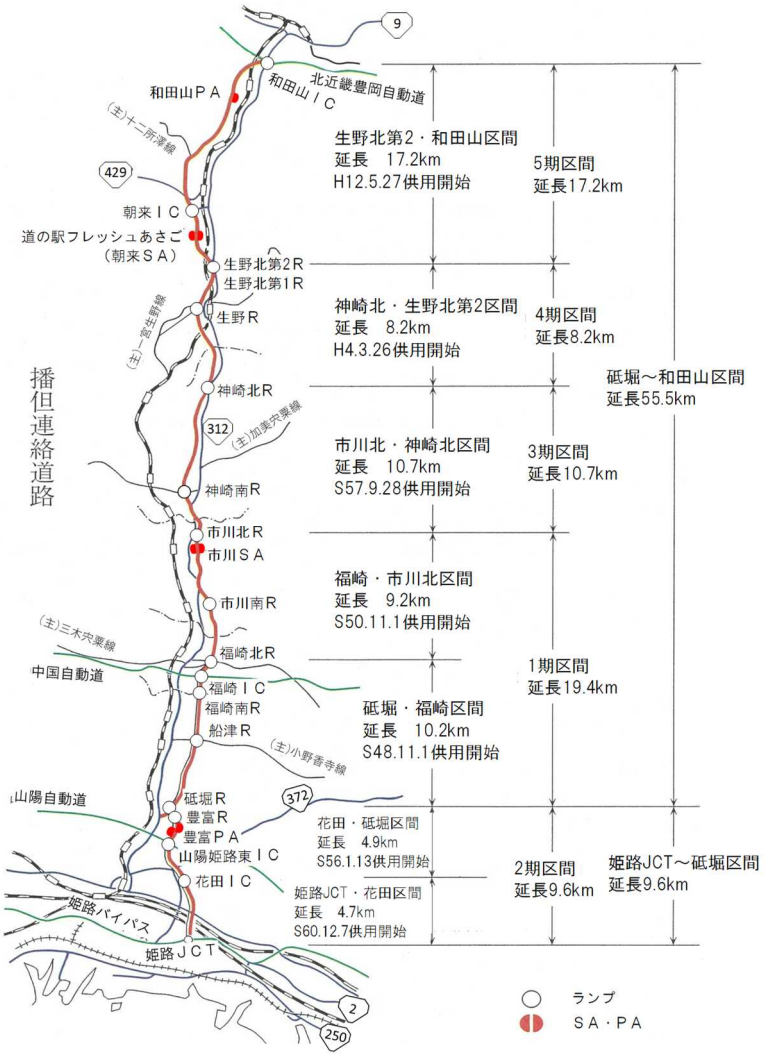


② 遠阪トンネル（L=4.7km、内トンネル2.6km）

遠阪トンネルは、丹波地域と但馬地域の境の交通の難所であった遠阪峠をトンネル化によって通行時間の短縮化と安全性の向上を実現したもので、昭和52年に供用を開始し、その後平成18年度に改築整備を行い、北近畿豊岡自動車道と一体となって但馬地域と丹波地域、阪神地域を結ぶ重要な基幹道路としての役割を果たしている。

【経　緯】

昭和52年５月25日　供用開始

平成18年７月22日　北近畿豊岡自動車道との接続による改築整備区間供用開始

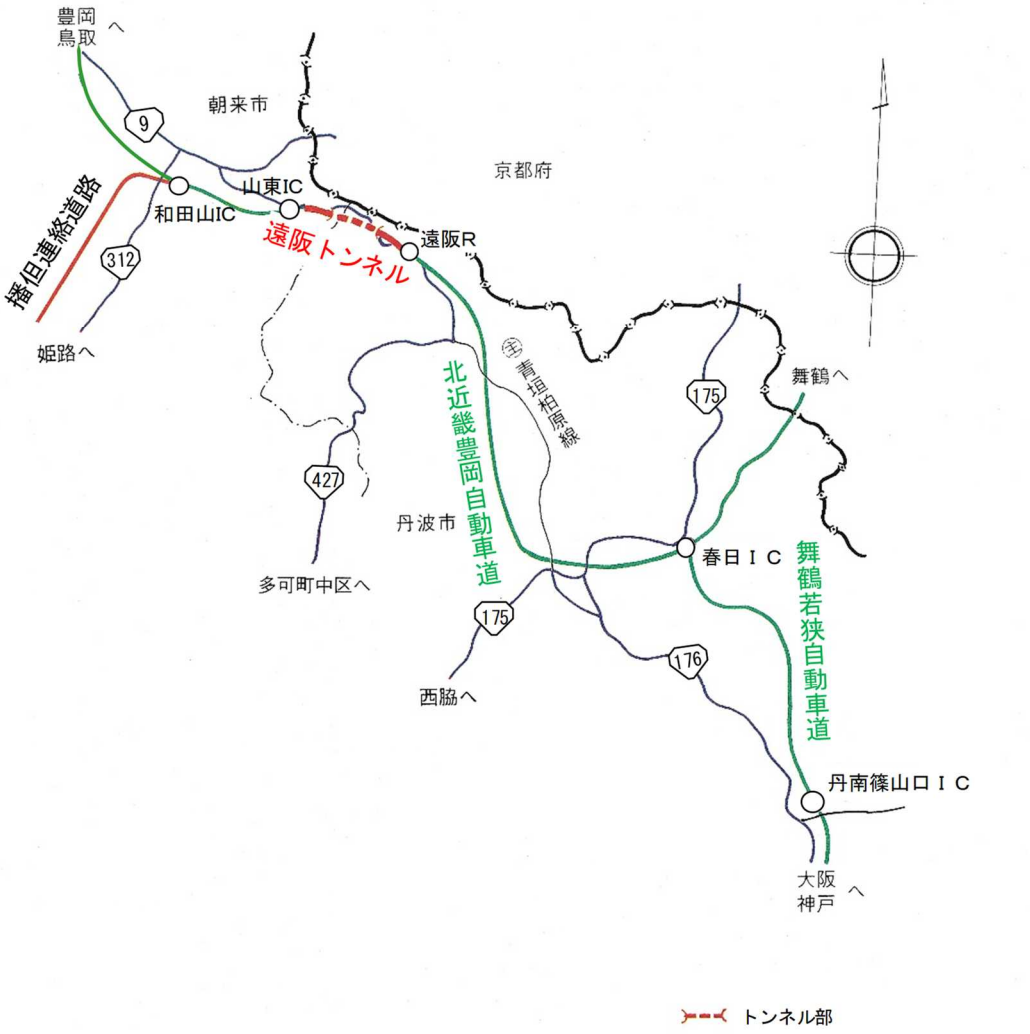

２　対象施設

公社が管理する播但連絡道路及び遠阪トンネルに存する、法令で位置付けられた施設とする。具体的な対象施設は表-１、管理施設数は表-２に示す。

表-１　対象施設

対象施設	主な根拠(関連)法令等
道路施設（橋梁、トンネル、大型の構造物（横断歩道橋、大型カルバート、門型標識、舗装等）、主要設備・施設等	道路法 第２条第１項

主要構造物　　表-２　管理施設一覧表　　令和８年９月時点

路線名	管理延長	橋梁		トンネル	大型ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（※２）	横断歩道橋	門型標識（※３）	舗装
		橋梁	溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）（※１）					
	km	橋	基	箇所	基	橋	基	km
播但連絡道路	65.1	215	87	15	9	2	24	191
遠阪トンネル	4.7	3	2	1	0	0	2	5
合計	69.8	218	89	16	9	2	26	196

（※１）橋長２ｍ以上かつ土被り１ｍ未満の溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）
（※２）内空に２車線以上の道路を有する程度の規模のﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
（※３）Ｒ８に播但連絡道路の24基のうち４基を撤去予定

主要設備・施設　　令和８年９月時点


路線名	道路照明灯	トンネル照明灯	道路情報板表示板	料金収受機械	ETC設備	ITV設備
	灯	灯	基	箇所	箇所	基
播但連絡道路	1,007	2,628	41	17	17	15
遠阪トンネル	49	904	4	1	1	17
合計	1,056	3,532	45	18	18	32


Ⅱ　対象施設の現状と課題

播但連絡道路及び遠阪トンネルは、構造物の区間が多く、両路線合わせて橋梁218橋、トンネル16箇所を管理し、両路線とも開通後約50年、構造物の約６割が40年以上を経過し、構造物の老朽化への対応が必要になっており、現在、平成26年の道路法改正に伴い、近接目視・打音検査など、より詳細な点検を５年サイクルで実施している。

２巡目（令和元～５年度）点検においては、道路橋では全218橋のうち６％（12橋）、トンネルでは全16箇所のうち６％（１箇所）、大型ボックスカルバートでは全９基のうち11％（１箇所）が早期に抜本的な対策が必要な判定区分Ⅲ（早期措置段階）と診断されている。

このような状況の中、将来にわたって安全性を保つためには、深刻な状況に至る前に、緊急度の高いところから早期かつ計画的に修繕などの対策を実施することが必要であり、そのために、点検から修繕に至る一連の持続可能なメンテナンスサイクルの確立が必要である。

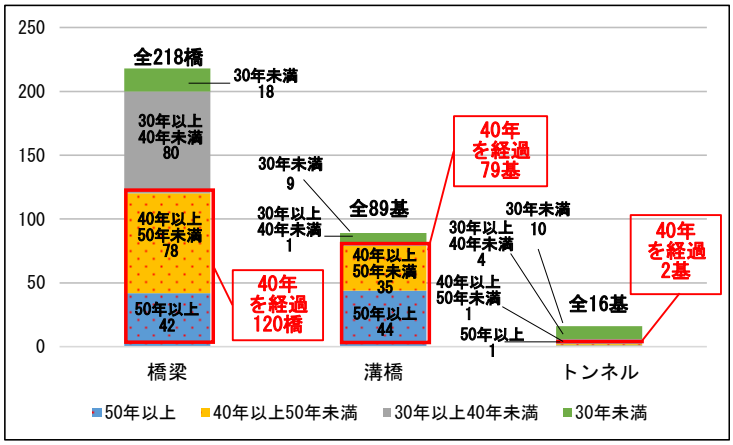

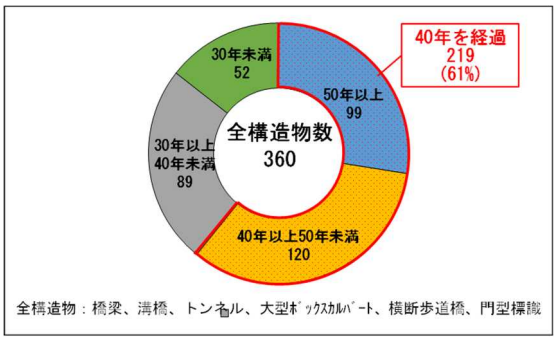

構造物の供用年数別グラフ

Ⅲ　点検と結果

1　点検・診断

公社では、平成 26 年の道路法改正に伴い、定期点検については近接目視に加えて打音検査や触診により点検を実施している。

また、以下に示すように法定点検に加えて、日常の道路管理パトロールにおいても点検を行い、構造物の安全性・走行性の確保に努めている。

① 通常点検

道路パトロール（６回/日）に併せて日常的に行う巡回及び点検





② 定期点検（法定点検等）

５年に１回の頻度で近接目視や打音（舗装は専用車）などにより、劣化・損傷度合を把握する点検

ドローンを用いた橋梁点検



高所作業車を用いた橋梁点検



高所作業車を用いたトンネル点検



③ 異常時点検（緊急点検）

地震や異常気象等の発生に伴い施設の損傷状況等を把握するための緊急点検

2　主要構造物及び設備施設の点検計画

点検計画を以下に示す。

表−３　各施設の点検計画表

○ 主要構造物　［点検実施計画　３巡目（Ｒ６～Ｒ10）点検］

令和８年９月時点

主要構造物	施設数		単位	Ｒ６	Ｒ７	Ｒ８	Ｒ９	Ｒ10	備考
橋梁	全体	218	橋	71	100	47			法定点検
	播但道	*215*		*71*	*100*	*44*			
	遠阪ＴＮ	*3*				*3*			
溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）	全体	89	基	30		2		57	〃
	播但道	*87*		*30*				*57*	
	遠阪ＴＮ	*2*				*2*			
トンネル	全体	16	基	1	2	2	5	6	〃
	播但道	*15*			*2*	*2*	*5*	*6*	
	遠阪ＴＮ	*1*		*1*					
大型ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	全体	9	基	3	5			1	〃
	播但道	*9*		*3*	*5*			*1*	
	遠阪ＴＮ	*0*							
横断歩道橋	全体	2	橋					2	〃
	播但道	*2*						*2*	
	遠阪ＴＮ	*0*							
門型標識	全体	26	基		21	3			法定点検 ※Ｒ８に播但道の４基を撤去予定
	播但道	*24*			*20*	*2*			
	遠阪ＴＮ	*2*			*1*	*1*			
舗装	全体	196	km		196				法定外点検
	播但道	*191*			*191*				
	遠阪ＴＮ	*5*			*5*				

○ 設備施設 施設管理要領（播但：H12. 3）に基づき保守・点検を実施　令和８年９月時点

日常点検	通常点検	定期点検	分解整備
１週	１ヵ月	半年or１年	適時(※)

（※）過去の整備記録を参考に定期点検の結果から判断

○ 判定区分一覧表

表-4 構造物等の判定区分表(構造物・舗装)

ア）構造物（道路橋・トンネル・大型ボックスカルバート・横断歩道橋・門型標識）

判定区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 優先：次回点検において判定区分Ⅲとなる恐れがある損傷を有している 軽微：今後の点検により判断
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、または、生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

イ）舗装

MCI(舗装維持管理指数)	修繕実施基準
5＜MCI	望ましい管理基準
4＜MCI≦5	修繕することが望ましい
3＜MCI≦4	修繕が必要
MCI≦3	早急に修繕が必要

管理基準：ＭＣＩ３超とする。(目安：ひび割れ率 40%、轍ぼれ 40mm、平坦性(IRI)８mm)

3 ２巡目(Ｒ１～Ｒ５)及び３巡目(Ｒ６～R10)の点検結果

点検判定区分と判定結果を以下に示す。

表-５ 施設数量と点検結果（構造物・舗装）

○ 構造物（道路橋・トンネル・大型ボックスカルバート・横断歩道橋・門型標識）

令和８年３月時点

主要構造物		施設数		２巡目(Ｒ１～Ｒ５)点検結果 判定区分 Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	３巡目(Ｒ６～R10)点検結果(※４) 判定区分 Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
橋梁	道路橋	全体	218		206	12			166	5	
		播但道	*215*		*203*	*12*			*166*	*5*	
		遠阪ＴＮ	*3*		*3*						
	溝橋(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)(※１)	全体	89		85	4			27	3	
		播但道	*87*		*83*	*4*			*27*	*3*	
		遠阪ＴＮ	*2*		*2*						
トンネル		全体	16		15	1			3		
		播但道	*15*		*14*	*1*			*2*		
		遠阪ＴＮ	*1*		*1*				*1*		
大型ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(※２)		全体	9		8	1			8		
		播但道	*9*		*8*	*1*			*8*		
		遠阪ＴＮ									
横断歩道橋		全体	2		2						
		播但道	*2*		*2*						
		遠阪ＴＮ									
門型標識(※３)		全体	26	3	23			1	11	9	
		播但道	*24*	*3*	*21*			*1*	*10*	*9*	
		遠阪ＴＮ	*2*		*2*				*1*		

（※１） 橋梁に含むﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄは、橋長２ｍ以上かつ土被り１ｍ未満のもの
（※２） 大型ｶﾙﾊﾞｰﾄは、内空に２車線以上の道路を有する程度の規模のもの
（※３） Ｒ８に播但道の24基のうち４基を撤去予定
（※４） 点検が完了しているＲ６とＲ７の結果

○ 舗装

路線名	総計延長（ｋｍ）	延長（km） MCI≦3	3＜MCI≦4	4＜MCI≦5	5＜MCI
播但連絡道路	190.7	32.8	37.3	37.0	83.6
遠阪トンネル	5.2	1.0	0.7	1.4	2.1
全体	195.9	33.8	38.0	38.4	85.7

※点検結果：令和７年度 路面性状調査

※延長：走行車線総延長の合計

【代表的な変状の事例】

○ 橋梁の損傷事例

上部工（床版ひびわれ・遊離石灰）



飛びの森第１橋（下り線）（令和６年度）

支承部（腐食）



薮田橋（上り）（令和６年度）

下部工（剥離・鉄筋露出・浮き）



越知川大橋（令和７年度）

舗装（ポットホール）



雲津橋（令和７年度）


○ トンネルの損傷事例

覆工の横断目地部（漏水）



播但トンネル（令和７年度）

覆工のアーチ天端部（浮き・剥離）

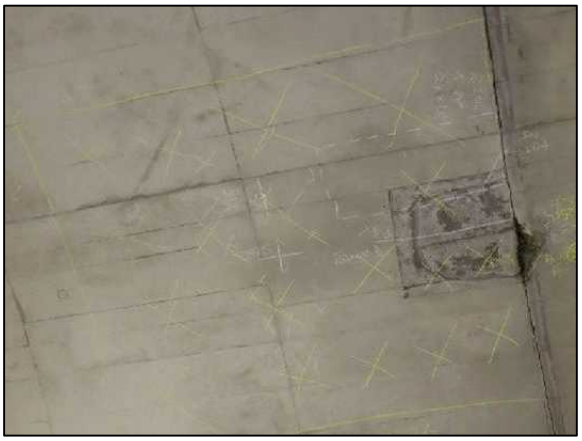

朝来第６トンネル（令和５年度）

○ 設備の損傷事例

ジェットファン（腐食）



朝来第２トンネル（令和８年度）

トンネル照明（蛍光灯）



遠阪トンネル（令和８年度）

押しボタン通報装置（腐食）



城山トンネル（令和８年度）

可変速度規制標識（老朽化）



朝来第２トンネル南坑口　下り 47.95kp
（令和８年度）

○ 料金収受機械設備の損傷事例

通行券自動発券機（腐食）



神崎北料金所Ｌ－２（令和８年度）

車高計（腐食）



花田本線料金所Ｌ－１（令和８年度）

Ⅳ　計画の基本方針

本計画では、対象施設の現状と課題を抽出するとともに取り組むべき方針を示し、公社の経営理念に基づき、維持管理・修繕等に向けた取り組みを推進する。

基本方針

圏域の基幹的な社会基盤として、将来にわたり、現状の自動車専用道路としての走行の安全性・速達性を確保し、道路が持つ機能を持続的に発揮させていくことを責務とし、必要な対策を早期かつ計画的に行っていく。

［参考］公社の経営理念

～兵庫の元気を地域とともに創る～

安全を最優先し、いつでも安心して快適に利用できる道路サービスの提供により交流を促進し、持続的に成長する元気な地域づくりに貢献します。

Ⅴ　個別施設の計画

１　計画の進め方

個別施設計画の推進にあたっては、各施設の状態や重要度、役割、機能を踏まえて対策の優先順位を検討したうえで、費用の平準化を図るなど、以下の基本的な考え方及びＰＤＣＡサイクルによるフィードバックをもとに実行する。更に、施設の健全度は経年劣化の進行度合により変化することから、新たに行う点検・診断結果を踏まえ、計画を適宜見直していく。

① 基本的な考え方

早期措置：

緊急度の高いものから優先的に修繕し、点検結果が判定区分Ⅲ(早期措置段階)のものは判定区分Ⅳ(緊急措置段階)や大規模更新の必要が生じないよう早期に措置を実施する。

予防保全:

各路線の特性を見極めながら、損傷の進行を未然に防ぐ予防保全の観点のもと、施設の長寿命化、ライフサイクルコストの縮減に努め、計画的に修繕を行う。

特に管理数の多い橋梁においては、これまでの点検で確認されてきた損傷の傾向と評価結果を踏まえて、構造に影響を及ぼす顕著な損傷を抽出し、効率的な予防保全対策の実現を目指す。

② ＰＤＣＡサイクルによるフィードバック

長寿命化修繕計画(Plan)に基づき、修繕(Do)、５年に１回の法定点検(Check)や日常管理により、常に改善・見直し(Action)を行う PDCA サイクルにより、得られた知見を今後の維持管理にフィードバックし、管理レベルを継続的に高めていくとともに、計画の見直しを適宜行う。

２　個別施設計画

別添「点検計画・修繕計画」のとおり(14ページ～28ページ)

点検結果で判定区分Ⅲ(早期措置段階)は、次回点検までに修繕を完了する。

判定区分Ⅱ(予防保全段階)のうち、点検結果による損傷を見極めながら「優先すべき損傷」を有する施設から修繕に着手し、次回点検までの修繕を目標とする。

３　計画期間

５年に１回の橋梁、トンネル等の点検サイクル(３巡目：令和６～10年度)にあわせ、令和10年度までを計画期間とする。

Ⅵ　計画推進に当たっての留意事項

１　社会的な理解を得るための情報提供

構造物の老朽化と高いサービス水準を維持するための管理の重要性、更には大規模修繕・更新等への投資の必要性について、社会にわかりやすくＰＲ、説明し、県民やお客さまの理解を得ていく必要がある。

２　関係機関との連携

計画の推進にあたっては、国や交通管理者、沿線の市町及び本来道路管理者である県等との情報共有が重要であり、各段階において十分な連携を図りながら対策を進めていく必要がある。

３　体制整備と技術者の育成、新技術の積極的導入

計画を円滑かつ着実に進めるため、事業執行可能な体制整備や仕組みづくりを進める必要がある。

また、将来世代への技術の伝承が可能となるよう各種研修や職員の研鑽などにより専門的知識を持つ技術者の継続的な育成が必要である。

新技術については、専門家の知見も踏まえながら、構造物の長寿命化、ライフサイクルコストの縮減、施工の効率化、維持管理の高度化などの観点から積極的な導入の検討が必要である。

４　データベースの活用

各構造物の健全度の変化を的確に把握するため、点検結果や修繕履歴をデータベース等に反映・蓄積し、フィードバックを行いながら維持管理できる仕組みの構築が必要である。公社では、令和３年度に橋梁マネジメントシステムを構築し、これまでの点検・補修データを蓄積し、今後の対策に活用していく。

Ⅶ　予算

１　資金の確保

播但連絡道路については、労務費や資材などの高騰などに対応するため、県と連携し、「播但連絡道路における管理運営のあり方等に関する有識者会議」を設置（令和８年５月22日）して、料金体系の見直しや償還時期などを含め、今後の管理運営体制のあり方について検討を進めている。

遠阪トンネルについては、「遠阪トンネル有料道路の老朽化対策等に関する有識者会議提言（令和６年３月13日）」を踏まえ、必要な財源の確保は最大の受益者である利用者に負担を求める観点から、料金徴収期間を15年延長（令和23年３月まで）して、大規模修繕・更新に必要な資金（約40億円）を確保した。今後も定期点検結果などを踏まえ、必要な対策を効率的、効果的に推進していく。

２　予算管理

維持管理・修繕等にかかる計画的な費用投資を行うためには、労務費及び物価高騰等による対策費用の増額を考慮し、新技術・新工法の積極的な導入等により維持管理・修繕等のコスト縮減や施工の効率化などを図り、予算の平準化に努めることが重要である。

本計画においては、点検・診断を通じて把握した劣化・損傷の状況を踏まえ、施設毎に対策費用や対応の緊要性を検討の上、対策の優先順位を設け、計画的に修繕を実施する。

Ⅷ　結びに

本計画を継続し発展するため、記載の取り組みを充実・深化させる。

また、取り組みの進捗状況を把握するとともに、必要に応じてフォローアップを行うことで、安定した質の高いサービスを堅持していく。

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画【道路橋】

令和８年９月時点

番号	路線名	橋梁名	橋梁形式	建設年次	橋長(m)	幅員(m)	場所	点検記録				点検計画						修繕計画						備考
								２巡目(R1～R5)		３巡目(R6～R10)		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分													
1	播但連絡道路	Eランプ橋	3径間連続鋼箱桁橋	1985	69.0	7.5	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
2	播但連絡道路	Bランプ橋第3橋	2径間連続鋼箱桁橋	1985	53.5	13.2	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
3	播但連絡道路	Bランプ橋第2橋	単純鋼箱桁橋	1985	37.5	13.2	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
4	播但連絡道路	Aランプ第2橋	単純鋼非合成箱桁橋	1985	44.5	8.1	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●					●			○		
5	播但連絡道路	Fランプ橋	単純PCポステンT桁橋	1985	30.5	6.5	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
6	播但連絡道路	Bランプ橋第1橋	単純PCプレテンT桁橋	1985	20.9	9.5	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
7	播但連絡道路	Aランプ第1橋	単純PCプレテンT桁橋	1985	20.9	6.5	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●							○			
8	播但連絡道路	第9-2高架橋(下り)	8径間単純PCプレテンT桁橋	1985	164.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●								○		
9	播但連絡道路	第9-2高架橋(上り)	8径間単純PCプレテンT桁橋	1991	164.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
10	播但連絡道路	南山跨道橋(下り)	単純鋼合成箱桁橋	1985	72.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●					●			○		
11	播但連絡道路	南山跨道橋(上り)	単純鋼合成箱桁橋	1991	72.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
12	播但連絡道路	第9-1高架橋(下り)	3径間単純PCプレテンT桁橋	1984	56.5	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
13	播但連絡道路	第9-1高架橋(上り)	3径間単純PCプレテンT桁橋	1992	56.5	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
14	播但連絡道路	天川2号橋(下り)	単純鋼合成箱桁橋	1984	65.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●					●	●		○		
15	播但連絡道路	天川2号橋(上り)	単純鋼合成箱桁橋	1992	65.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●					●	●				
16	播但連絡道路	新幹線大橋(その2)(下り)	単純RCT桁橋	1983	12.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
17	播但連絡道路	新幹線大橋(その2)(上り)	単純RCT桁橋	1992	12.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
18	播但連絡道路	新幹線大橋(その1)(下り)	2径間連続鋼非合成箱桁橋	1984	85.0	10.3	姫路市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
19	播但連絡道路	新幹線大橋(その1)(上り)	2径間連続鋼非合成箱桁橋	1992	85.0	10.3	姫路市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
20	播但連絡道路	第8高架橋(下り)	13径間単純PCプレテンT桁橋	1984	266.5	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
21	播但連絡道路	第8高架橋(上り)	13径間単純PCプレテンT桁橋	1992	266.5	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●					●					
22	播但連絡道路	佐土高架橋(下り)	単純PCポステンT桁橋	1985	35.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
23	播但連絡道路	佐土高架橋(上り)	単純PCポステンT桁橋	1992	35.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
24	播但連絡道路	第7高架橋(その3)(下り)	3径間単純PCプレテンT桁橋	1985	61.5	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
25	播但連絡道路	第7高架橋(その2)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1985	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
26	播但連絡道路	第7高架橋(その1)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1985	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
27	播但連絡道路	第7高架橋(その3)(上り)	3径間単純PCプレテンT桁橋	1992	61.5	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
28	播但連絡道路	第7高架橋(その2)(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1992	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
29	播但連絡道路	第7高架橋(その1)(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1992	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
30	播但連絡道路	第6高架橋(その5)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1985	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
31	播但連絡道路	第6高架橋(その4)(下り)	4径間連続RC中空床版橋	1985	68.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
32	播但連絡道路	第6高架橋(その3)(下り)	4径間連続RC中空床版橋	1985	68.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅰ			●						●				

(※)点検計画及び修繕計画について、●:実施済、○:実施予定を示す
(※)定期点検の結果により、修繕延長及び修繕年次を適宜見直す

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画【道路橋】

令和８年９月時点

番号	路線名	橋梁名	橋梁形式	建設年次	橋長(m)	幅員(m)	場所	点検記録				点検計画						修繕計画						備考
								２巡目(R1～R5)		３巡目(R6～R10)		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分													
33	播但連絡道路	第6高架橋(その2)(下り)	4径間連続RC中空床版橋	1985	68.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅰ			●										
34	播但連絡道路	第6高架橋(その1)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1985	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
35	播但連絡道路	第6高架橋(その5)(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1992	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
36	播但連絡道路	第6高架橋(その4)(上り)	4径間連続RC中空床版橋	1992	68.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
37	播但連絡道路	第6高架橋(その3)(上り)	4径間連続RC中空床版橋	1992	68.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
38	播但連絡道路	第6高架橋(その2)(上り)	3径間連続RC中空床版橋	1992	68.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
39	播但連絡道路	第6高架橋(その1)(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1992	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
40	播但連絡道路	高尾高架橋(下り)	単純PCポステンT桁橋	1985	27.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
41	播但連絡道路	高尾高架橋(上り)	単純PCポステンT桁橋	1992	27.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
42	播但連絡道路	第5高架橋(その3)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1985	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
43	播但連絡道路	第5高架橋(その2)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1985	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
44	播但連絡道路	第5高架橋(その1)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1985	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●								○		
45	播但連絡道路	第5高架橋(その4)(上り)	4径間連続RC中空床版橋	1992	65.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
46	播但連絡道路	第5高架橋(その3)(上り)	3径間連続RC中空床版橋	1992	51.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●								○		
47	播但連絡道路	第5高架橋(その2)(上り)	3径間連続RC中空床版橋	1992	68.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
48	播但連絡道路	第5高架橋(その1)(上り)	4径間連続RC中空床版橋	1992	68.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
49	播但連絡道路	第4高架橋(その2)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1984	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●					●			○		
50	播但連絡道路	第4高架橋(その1)(下り)	4径間連続RC中空床版橋	1984	56.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
51	播但連絡道路	第4高架橋(その2)(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1992	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
52	播但連絡道路	第4高架橋(その1)(上り)	4径間連続RC中空床版橋	1992	56.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
53	播但連絡道路	御国野高架橋(下り)	単純PCポステンT桁橋	1985	30.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
54	播但連絡道路	御国野高架橋(上り)	単純PCポステンT桁橋	1992	30.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
55	播但連絡道路	第3高架橋(その3)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1984	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
56	播但連絡道路	第3高架橋(その2)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1984	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●								○		
57	播但連絡道路	第3高架橋(その1)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1984	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
58	播但連絡道路	第3高架橋(その3)(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1992	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
59	播但連絡道路	第3高架橋(その2)(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1992	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
60	播但連絡道路	第3高架橋(その1)(上り)	3径間連続RC中空床版橋	1992	51.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
61	播但連絡道路	第2高架橋(その3)(下り)	3径間連続RC中空床版橋	1984	45.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
62	播但連絡道路	第2高架橋(その2)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1984	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
63	播但連絡道路	第2高架橋(その1)(下り)	4径間連続RC中空床版橋	1984	63.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
64	播但連絡道路	第2高架橋(その3)(上り)	3径間連続RC中空床版橋	1992	64.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●								○		

(※)点検計画及び修繕計画について、●:実施済、○:実施予定を示す
(※)定期点検の結果により、修繕延長及び修繕年次を適宜見直す

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画【道路橋】

令和８年９月時点

番号	路線名	橋梁名	橋梁形式	建設年次	橋長(m)	幅員(m)	場所	点検記録				点検計画						修繕計画						備考
								２巡目(R1～R5)		３巡目(R6～R10)		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分													
65	播但連絡道路	第2高架橋(その2)(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1992	83.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
66	播但連絡道路	第2高架橋(その1)(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1992	82.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
67	播但連絡道路	第1高架橋(下り)	6径間単純PCポステンT桁橋	1985	180.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
68	播但連絡道路	第1高架橋(上り)	6径間単純PCポステンT桁橋	1992	178.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅲ			●								○		R7点検Ⅲ判定(R9修繕)
69	播但連絡道路	深志野高架橋(下り)	単純PCポステンT桁橋	1985	27.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
70	播但連絡道路	深志野高架橋(上り)	単純PCポステンT桁橋	1992	27.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
71	播但連絡道路	第1-1高架橋(その5)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1984	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
72	播但連絡道路	第1-1高架橋(その4)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1984	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
73	播但連絡道路	第1-1高架橋(その3)(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1984	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
74	播但連絡道路	第1-1高架橋(その2)(下り)	4径間連続RC中空床版橋	1984	68.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
75	播但連絡道路	第1-1高架橋(その1)(下り)	3径間連続RC中空床版橋	1984	50.2	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
76	播但連絡道路	第1-1高架橋(その5)(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1992	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
77	播但連絡道路	第1-1高架橋(その4)(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1992	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●								○		
78	播但連絡道路	第1-1高架橋(その3)(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1992	85.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
79	播但連絡道路	第1-1高架橋(その2)(上り)	4径間連続RC中空床版橋	1992	68.0	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
80	播但連絡道路	第1-1高架橋(その1)(上り)	3径間連続RC中空床版橋	1992	50.2	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
81	播但連絡道路	天川1号橋(下り)	単純鋼床版箱桁橋	1984	77.3	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
82	播但連絡道路	天川1号橋(上り)	単純鋼床版箱桁橋	1992	76.3	10.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
83	播但連絡道路	花田Dランプ橋	2径間単純RC中実床版橋	1978	21.6	7.5	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●								○		
84	播但連絡道路	花田Cランプ橋	2径間単純RC中実床版橋	1978	21.6	13.8	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
85	播但連絡道路	花田Aランプ橋	2径間単純RC中実床版橋	1978	21.6	7.5	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
86	播但連絡道路	花田ICランプ橋	単純RC中空床版橋	2000	20.2	9.7	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
87	播但連絡道路	城北橋(下り)	単純PCポステンT桁橋	1978	27.5	11.0	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
88	播但連絡道路	城北橋(上り)	単純PCポステンT桁橋	1978	27.5	11.0	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
89	播但連絡道路	豊国第6橋(下り)	3径間連続RC中空床版橋	1981	51.0	14.4	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●								○	○		
90	播但連絡道路	豊国第6橋(上り)	3径間連続RC中空床版橋	1981	51.0	14.4	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
91	播但連絡道路	豊国第5橋(下り)	3径間連続RC中空床版橋	1981	46.0	14.4	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●						
92	播但連絡道路	豊国第5橋(上り)	3径間連続RC中空床版橋	1981	46.0	14.4	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
93	播但連絡道路	豊国第4橋(下り)	単純PCポステンT桁橋	1979	30.0	13.8	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●						
94	播但連絡道路	豊国第4橋(上り)	単純PCポステンT桁橋	1992	30.0	10.8	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
95	播但連絡道路	豊国第3橋(下り)	3径間連続RC中空床版橋	1979	47.0	12.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●	●					
96	播但連絡道路	豊国第3橋(上り)	3径間連続RC中空床版橋	1993	47.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											

(※)点検計画及び修繕計画について、●:実施済、○:実施予定を示す
(※)定期点検の結果により、修繕延長及び修繕年次を適宜見直す

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画【道路橋】

令和８年９月時点

番号	路線名	橋梁名	橋梁形式	建設年次	橋長(m)	幅員(m)	場所	点検記録				点検計画						修繕計画						備考
								２巡目(R1～R5)		３巡目(R6～R10)		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分													
97	播但連絡道路	豊国第2橋(下り)	2径間単純PCポステンT桁橋	1979	68.0	12.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●	●					
98	播但連絡道路	豊国第2橋(上り)	3径間連続RC中空床版橋	1992	68.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●									○		
99	播但連絡道路	豊国第1橋(下り)	3径間連続RC中空床版橋	1979	51.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●	●					
100	播但連絡道路	豊国第1橋(上り)	3径間連続RC中空床版橋	1992	51.0	12.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
101	播但連絡道路	庄第7橋(下り)	4径間連続RC中空床版橋	1978	61.5	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●	●					
102	播但連絡道路	庄第7橋(上り)	4径間連続RC中空床版橋	1993	61.5	10.3	姫路市	R1年度	Ⅲ	R6年度	Ⅱ		●									○		R1点検Ⅲ判定(R3修繕)
103	播但連絡道路	庄跨道橋(下り)	単純PCポステンT桁橋	1978	23.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅲ		●							●			○	R6点検Ⅲ判定(R7修繕)
104	播但連絡道路	庄跨道橋(上り)	単純PCポステンT桁橋	1993	23.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
105	播但連絡道路	庄第6橋(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1977	81.5	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●	●					
106	播但連絡道路	庄第6橋(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1993	81.5	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
107	播但連絡道路	庄第5橋(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1977	85.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●	●					
108	播但連絡道路	庄第5橋(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1993	85.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
109	播但連絡道路	庄第4橋(下り)	3径間連続RC中空床版橋	1977	51.0	12.1	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●	●					
110	播但連絡道路	庄第4橋(上り)	2径間連続RC中空床版橋	1993	35.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
111	播但連絡道路	谷外35号橋(下り)	2径間単純PCポステンT桁橋	1978	62.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●						
112	播但連絡道路	谷外35号橋(上り)	2径間単純PCポステンT桁橋	1993	66.5	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●						●			○		
113	播但連絡道路	庄第3橋(下り)	4径間連続RC中空床版橋	1978	68.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●	●					
114	播但連絡道路	庄第3橋(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1993	79.5	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
115	播但連絡道路	庄第2橋(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1978	85.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●									○		
116	播但連絡道路	庄第2橋(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1993	85.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
117	播但連絡道路	庄第1橋(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1978	85.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●	●					
118	播但連絡道路	庄第1橋(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1993	85.0	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
119	播但連絡道路	蓮池橋(下り)	2径間単純PCポステンT桁橋	1978	70.3	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●						
120	播但連絡道路	蓮池橋(上り)	2径間単純PCポステンT桁橋	1993	70.3	10.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●									○		
121	播但連絡道路	佐良和高架橋(下り)	4径間単純PCポステンT桁橋	1978	100.0	10.8	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
122	播但連絡道路	佐良和高架橋(上り)	2径間連結PCポステンT桁橋(2連)	1993	100.0	10.8	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●										○	
123	播但連絡道路	豊富ランプ橋	単純PCポステンT桁橋	1993	21.0	10.5	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
124	播但連絡道路	飛の森第4橋(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1977	87.5	10.0	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●									○		
125	播但連絡道路	飛の森第4橋(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1991	87.5	10.5	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●									○		
126	播但連絡道路	飛の森第3橋(下り)	単純PCポステンT桁橋	1977	25.0	9.8	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●						●				○	
127	播但連絡道路	飛の森第3橋(上り)	単純PCポステンT桁橋	1991	25.0	10.5	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●						●					
128	播但連絡道路	飛の森第2橋(下り)	3径間連続RC中空床版橋	1975	52.5	9.8	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											

(※)点検計画及び修繕計画について、●:実施済、○:実施予定を示す
(※)定期点検の結果により、修繕延長及び修繕年次を適宜見直す

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画【道路橋】

令和８年９月時点

番号	路線名	橋梁名	橋梁形式	建設年次	橋長(m)	幅員(m)	場所	点検記録				点検計画						修繕計画						備考
								２巡目(R1～R5)		３巡目(R6～R10)		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分													
129	播但連絡道路	飛の森第2橋(上り)	3径間連続RC中空床版橋	1991	52.5	10.5	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
130	播但連絡道路	飛の森第1橋(下り)	3径間単純鋼合成I桁橋	1977	92.3	9.8	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅲ		●								○	○	○	R6点検Ⅲ判定(R8～10修繕)
131	播但連絡道路	飛の森第1橋(上り)	3径間単純鋼合成I桁橋	1992	92.3	10.5	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●							●		○		
132	播但連絡道路	薮田橋(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1972	85.0	9.8	姫路市	R1年度	Ⅲ	R6年度	Ⅱ		●							●		○		R1点検Ⅲ判定(R3修繕)
133	播但連絡道路	薮田橋(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1972	85.0	9.8	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●							●		○		
134	播但連絡道路	市川大橋1(下り)	3径間連続RC中空床版橋	1973	46.2	9.3	姫路市	R1年度	Ⅲ	R6年度	Ⅱ		●					●						R1点検Ⅲ判定(R5修繕)
135	播但連絡道路	市川大橋1(上り)	3径間連続RC中空床版橋	1973	46.2	9.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
136	播但連絡道路	市川大橋2(下り)	単純鋼合成I桁橋	1973	40.0	9.3	姫路市	R1年度	Ⅲ	R6年度	Ⅱ		●					●						R1点検Ⅲ判定(R5修繕)
137	播但連絡道路	市川大橋2(上り)	単純鋼合成I桁橋	1973	40.0	9.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
138	播但連絡道路	市川大橋3(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1973	85.0	9.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●						
139	播但連絡道路	市川大橋3(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1973	85.0	9.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
140	播但連絡道路	市川大橋4(下り)	5径間連続RC中空床版橋	1973	85.0	9.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●					●						
141	播但連絡道路	市川大橋4(上り)	5径間連続RC中空床版橋	1973	85.0	9.3	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
142	播但連絡道路	市川大橋5(下り)	3径間連続鋼非合成I桁橋	1973	133.5	9.3	姫路市	R1年度	Ⅲ	R6年度	Ⅱ		●					●						R1点検Ⅲ判定(R5修繕)
143	播但連絡道路	市川大橋5(上り)	3径間連続鋼非合成I桁橋	1973	133.5	9.3	姫路市	R1年度	Ⅲ	R6年度	Ⅱ		●					●						R1点検Ⅲ判定(R5修繕)
144	播但連絡道路	市川大橋6(下り)	2径間連続鋼非合成I桁橋	1973	89.0	9.3	姫路市	R1年度	Ⅲ	R6年度	Ⅱ		●					●						R1点検Ⅲ判定(R5修繕)
145	播但連絡道路	市川大橋6(上り)	2径間連続鋼非合成I桁橋	1973	89.0	9.3	姫路市	R1年度	Ⅲ	R6年度	Ⅱ		●					●						R1点検Ⅲ判定(R5修繕)
146	播但連絡道路	御陰橋	単純PCプレテン中空床版橋	1973	13.6	21.7	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●							●			○	
147	播但連絡道路	酒井橋	単純PCプレテン中空床版橋	1973	11.4	21.7	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
148	播但連絡道路	太尾橋	単純RC中実床版橋	1973	19.0	21.7	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
149	播但連絡道路	平田橋1	単純PCポステンT桁橋	1973	33.3	21.7	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
150	播但連絡道路	平田橋2	単純PCプレテン中空床版橋	1973	11.4	21.7	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
151	播但連絡道路	仁色橋	単純RC中実床版橋	1973	15.0	21.7	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
152	播但連絡道路	中野橋	単純PCプレテン中空床版橋	1973	13.6	21.7	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
153	播但連絡道路	船津橋	単純PCプレテン中空床版橋	1973	13.5	21.7	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●										○	
154	播但連絡道路	八幡橋	単純PCプレテン中空床版橋	1973	13.6	21.7	姫路市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●										○	
155	播但連絡道路	西光寺橋	単純PCプレテンT桁橋	1973	18.7	27.7	福崎町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●										○	
156	播但連絡道路	落ケ池橋1	単純鋼合成箱桁橋	1973	46.2	27.5	福崎町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
157	播但連絡道路	落ケ池橋2	2径間単純鋼合成I桁橋	1973	64.8	27.5	福崎町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
158	播但連絡道路	大門橋	3径間単純PCプレテンT桁橋	1972	65.2	24.0	福崎町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●									○	
159	播但連絡道路	雲津橋	2径間単純鋼合成I桁橋	1974	50.0	35.4	福崎町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅲ			●							○			R7点検Ⅲ判定(R8修繕)
160	播但連絡道路	北野橋	単純PCプレテンT桁橋	1974	21.5	11.0	福崎町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										

(※)点検計画及び修繕計画について、●:実施済、○:実施予定を示す
(※)定期点検の結果により、修繕延長及び修繕年次を適宜見直す

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画【道路橋】

令和８年９月時点

番号	路線名	橋梁名	橋梁形式	建設年次	橋長(m)	幅員(m)	場所	点検記録				点検計画						修繕計画						備考
								２巡目(R1～R5)		３巡目(R6～R10)		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分													
161	播但連絡道路	岡部川大橋1	単純PCプレテン床版橋	1974	11.4	11.0	市川町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●									○	
162	播但連絡道路	岡部川大橋2	2径間単純鋼合成I桁橋	1974	96.0	11.0	市川町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●							○			
163	播但連絡道路	岡部川大橋3	4径間連続RC中空床版橋	1974	68.2	11.0	市川町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●									○	
164	播但連絡道路	東新橋	単純PCポステンT桁橋	1974	22.7	11.5	市川町	R3年度	Ⅱ	R8年度														
165	播但連絡道路	東川辺橋	単純PCポステンT桁橋	1974	24.7	11.0	市川町	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
166	播但連絡道路	長正寺橋	3径間連続RC中空床版橋	1974	37.5	11.0	市川町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
167	播但連絡道路	川辺橋	単純PCポステンT桁橋	1974	24.7	14.6	市川町	R3年度	Ⅱ	R8年度					○						○			
168	播但連絡道路	浅野第2橋	単純PCポステンT桁橋	1974	21.8	11.0	市川町	R3年度	Ⅱ	R8年度					○						○		○	
169	播但連絡道路	浅野高架橋	2径間単純PCポステンT桁橋	1974	46.5	11.2	市川町	R3年度	Ⅱ	R8年度					○								○	
170	播但連絡道路	奥谷橋(尾形高架橋)	単純PCポステンT桁橋	1980	21.7	10.1	市川町	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
171	播但連絡道路	越知川大橋	3径間連続鋼鋼床版箱桁橋	1982	272.0	9.5	市川町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅲ			●							○	○		R7点検Ⅲ判定(R8修繕)
172	播但連絡道路	岡田橋	2径間単純PCポステンT桁橋	1982	60.0	14.7	神河町	R3年度	Ⅱ	R8年度					○					●	○			
173	播但連絡道路	竹の内橋	単純RC中空床版橋	1980	17.0	15.9	神河町	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
174	播但連絡道路	加納橋	単純PCポステンT桁橋	1980	23.1	10.1	神河町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●					●					
175	播但連絡道路	新中の谷橋(大山高架橋)	3径間単純PCポステンT桁橋	1982	75.0	9.5	神河町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●						●				
176	播但連絡道路	新小谷橋	単純PCポステンT桁橋	1982	25.0	10.0	神河町	R3年度	Ⅲ	R8年度					○					●		○	○	R3点検Ⅲ判定(R3修繕)
177	播但連絡道路	上大山橋	鋼単純非合成I桁橋	1988	45.0	11.1	神河町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●							○	○		
178	播但連絡道路	真弓大橋	3径間連続鋼非合成箱桁橋、単純鋼合成箱桁橋	1991	295.0	10.0	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○							○		
179	播但連絡道路	生野橋	2径間単純鋼非合成I桁橋、単純鋼非合成I桁橋	1992	56.0	15.0	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
180	播但連絡道路	小田和橋	4径間単純PCポステンT桁橋	1992	146.0	10.0	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
181	播但連絡道路	中山橋	単純鋼合成I桁橋	1991	34.0	17.7	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○						○			
182	播但連絡道路	向田橋	3径間連続鋼非合成箱桁橋	1992	148.0	14.5	朝来市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
183	播但連絡道路	生野北第1Dランプ橋	2径間連続鋼非合成I桁橋	2000	74.0	5.8	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○							○		
184	播但連絡道路	薬師山橋	2径間連続非合成箱桁橋	1992	110.0	6.5	朝来市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●							○			
185	播但連絡道路	上田橋	単純PCプレテン床版橋	1992	7.1	6.5	朝来市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
186	播但連絡道路	円山あげた橋	単純PCプレテン中空床版橋	1997	18.5	11.7	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
187	播但連絡道路	円山そり橋	単純鋼非合成箱桁橋	1996	46.0	11.7	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○							○		
188	播但連絡道路	円山堂岡橋	4径間連続鋼非合成I桁橋	1999	157.0	11.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○							○		
189	播但連絡道路	岩津橋	3径間連続鋼非合成I桁橋	1996	109.0	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○							○		
190	播但連絡道路	田路橋	4径間連続PCポステン箱桁橋	1998	168.0	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○						○		○	
191	播但連絡道路	羽渕橋	2径間連続鋼非合成I桁橋	1996	86.5	10.5	朝来市	R1年度	Ⅲ	R6年度	Ⅱ		●								○			R1点検Ⅲ判定(R4修繕)
192	播但連絡道路	朝来Aランプ橋	2径間連続鋼非合成I桁橋	1996	81.5	6.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○							○		

(※)点検計画及び修繕計画について、●:実施済、○:実施予定を示す
(※)定期点検の結果により、修繕延長及び修繕年次を適宜見直す

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画【道路橋】

令和８年９月時点

番号	路線名	橋梁名	橋梁形式	建設年次	橋長(m)	幅員(m)	場所	点検記録				点検計画						修繕計画						備考
								２巡目(R1～R5)		３巡目(R6～R10)		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分													
193	播但連絡道路	朝来Eランプ橋	単純PCプレテン中空床版橋	1997	15.0	26.2	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
194	播但連絡道路	越山橋	3径間連続PCポステン中空床版橋	1999	66.8	29.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○							○	○	
195	播但連絡道路	みどり橋	単純PCポステンT桁橋	1999	30.0	11.6	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
196	播但連絡道路	八代川橋	3径間連続鋼非合成I桁橋	1996	122.0	10.5	朝来市	R3年度	Ⅲ	R8年度					○							○		R3点検Ⅲ判定(R3修繕)
197	播但連絡道路	菅谷橋	2径間連続鋼非合成I桁橋	1998	109.4	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○							○		
198	播但連絡道路	立脇橋	3径間連結PCプレテンT桁橋	1998	60.1	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
199	播但連絡道路	釣坂橋	3径間連続鋼非合成I桁橋	1996	82.0	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○						○			
200	播但連絡道路	大谷橋	2径間連続鋼非合成I桁橋	1996	89.5	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○						○			
201	播但連絡道路	溝谷橋	3径間連続鋼非合成I桁橋	1996	111.0	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○							○		
202	播但連絡道路	物部第1橋	3径間連続鋼非合成I桁橋	1996	129.0	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○							○		
203	播但連絡道路	物部第2橋	4径間連続鋼非合成箱桁橋	1996	233.0	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○							○		
204	播但連絡道路	物部第3橋	3径間連続鋼非合成I桁橋	1996	60.0	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○						○		○	
205	播但連絡道路	物部第4橋	単純PCポステン中空床版橋	1999	18.0	11.6	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
206	播但連絡道路	物部第5橋	3径間連続鋼非合成I桁橋	1996	93.8	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○							○		
207	播但連絡道路	物部第6橋	4径間連続鋼非合成I桁橋	1996	150.0	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○							○		
208	播但連絡道路	物部第7橋	2径間連続PCラーメン橋	1998	125.0	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
209	播但連絡道路	物部第8橋	単純PCポステンT桁橋	1999	43.5	11.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
210	播但連絡道路	物部第9橋	4径間連続鋼非合成I桁橋	1996	191.0	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○								○	
211	播但連絡道路	大路大橋	5径間連続鋼非合成箱桁橋	1999	339.0	10.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○								○	
212	播但連絡道路	虎臥城大橋	12径間連続RC充腹アーチ橋	1999	402.0	10.8	朝来市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●									○		
213	播但連絡道路	竹田大橋(1-2)	2径間連続PCラーメン橋	1999	144.0	10.6	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
214	播但連絡道路	竹田大橋(2-2)	5径間連続PCポステン中空床版橋	1999	124.9	10.6	朝来市	R3年度	Ⅲ	R8年度					○							○	○	R3点検Ⅲ判定(R3修繕)
215	播但連絡道路	加都北跨道橋	2径間連続鋼非合成I桁橋	1999	103.7	22.5	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○								○	
216	遠阪トンネル	遠阪橋	2径間単純ポステンT桁橋	1976	61.5	10.0	丹波市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
217	遠阪トンネル	藤木新橋	5径間単純ポステンT桁橋	1976	153.8	10.5	丹波市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
218	遠阪トンネル	管理橋	単純PC床版橋	1976	17.7	6.7	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									

(※)点検計画及び修繕計画について、●:実施済、○:実施予定を示す
(※)定期点検の結果により、修繕延長及び修繕年次を適宜見直す

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画　【溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）】

令和８年９月時点

番号	路線名	施設名	建設年次	橋長（m）	幅員（m）	場所	点検記録				点検計画						修繕計画						備考
							２巡目(R1～R5)		３巡目(R6～R10)		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
							点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分													
1	播但連絡道路	的形３	1985	5.40	12.50	高砂市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
2	播但連絡道路	的形４	1985	4.90	34.70	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
3	播但連絡道路	的形１	1985	5.40	9.20	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
4	播但連絡道路	飾東１	1985	4.00	22.50	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
5	播但連絡道路	飾東２	1983	4.00	26.10	姫路市	R5年度	Ⅲ	R10年度		●					○		●					R5点検Ⅲ判定(R6修繕)
6	播但連絡道路	花田１	1977	3.00	22.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
7	播但連絡道路	花田４	1977	2.60	33.05	姫路市	R5年度	Ⅲ	R10年度		●					○		●					R5点検Ⅲ判定(R6修繕)
8	播但連絡道路	飾東11	1977	4.80	22.40	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
9	播但連絡道路	豊富10	不明	7.40	21.30	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
10	播但連絡道路	豊富11	不明	6.50	59.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
11	播但連絡道路	豊富12	1973	4.80	23.30	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
12	播但連絡道路	豊富13	1973	5.30	22.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
13	播但連絡道路	豊富18	1973	2.00	22.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
14	播但連絡道路	豊富20	1973	4.70	31.10	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
15	播但連絡道路	豊富24	1973	4.70	23.60	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
16	播但連絡道路	船津１	1973	7.34	22.10	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
17	播但連絡道路	船津４	1973	4.00	22.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
18	播但連絡道路	船津５	1973	4.50	22.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
19	播但連絡道路	船津７	1973	6.50	22.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
20	播但連絡道路	船津10	1973	3.50	34.90	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
21	播但連絡道路	船津11	1973	4.00	33.80	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
22	播但連絡道路	船津12	1973	5.20	22.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
23	播但連絡道路	船津13	1973	4.00	22.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
24	播但連絡道路	船津15	1973	3.50	22.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
25	播但連絡道路	船津16	1973	4.50	22.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
26	播但連絡道路	船津17	1973	4.00	22.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
27	播但連絡道路	船津18	1973	6.50	22.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
28	播但連絡道路	船津19	1973	3.50	23.65	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
29	播但連絡道路	船津21	1973	5.70	22.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
30	播但連絡道路	船津22	1973	5.10	42.00	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
31	播但連絡道路	福崎１	1973	2.60	56.70	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
32	播但連絡道路	福崎２	1973	4.60	27.57	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
33	播但連絡道路	福崎３	1973	4.60	27.58	福崎町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
34	播但連絡道路	福崎４	1973	7.00	27.50	福崎町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
35	播但連絡道路	福崎６	1973	6.00	27.55	福崎町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
36	播但連絡道路	福崎８	1973	6.00	40.40	福崎町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
37	播但連絡道路	福崎９	1973	3.50	28.15	福崎町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
38	播但連絡道路	福崎11	1973	4.60	27.55	福崎町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
39	播但連絡道路	福崎12	1973	7.00	27.50	福崎町	R5年度	Ⅲ	R10年度		●					○		●					R5点検Ⅲ判定(R6修繕)
40	播但連絡道路	福崎15	1973	2.60	35.10	福崎町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
41	播但連絡道路	福崎16	1973	4.00	19.10	福崎町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
42	播但連絡道路	福崎18	1973	4.00	14.30	福崎町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
43	播但連絡道路	福崎19	1973	4.40	11.50	福崎町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
44	播但連絡道路	市川１	1973	4.20	12.20	市川町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画　【溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）】

令和８年９月時点

番号	路線名	施設名	建設年次	橋長（m）	幅員（m）	場所	点検記録				点検計画						修繕計画						備考
							２巡目(R1～R5)		３巡目(R6～R10)		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
							点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分													
45	播但連絡道路	市川２	1973	5.30	11.53	市川町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
46	播但連絡道路	市川３	1973	6.00	11.55	市川町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
47	播但連絡道路	市川４	1973	4.30	12.30	市川町	R5年度	Ⅲ	R10年度		●					○		●					R5点検Ⅲ判定(R6修繕)
48	播但連絡道路	市川５	1973	3.00	12.47	市川町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
49	播但連絡道路	市川19	1973	12.00	44.00	市川町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
50	播但連絡道路	市川20	1973	2.50	16.70	市川町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
51	播但連絡道路	市川26	1974	4.20	14.10	市川町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
52	播但連絡道路	市川32	不明	2.00	9.05	市川町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
53	播但連絡道路	神崎１	1982	14.00	10.40	神河町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
54	播但連絡道路	神崎３	1982	7.20	15.53	神河町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
55	播但連絡道路	神崎3-1	1982	7.70	26.15	神河町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
56	播但連絡道路	神崎５	1982	5.90	10.57	神河町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
57	播但連絡道路	神崎5-1	1982	5.70	4.75	神河町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
58	播但連絡道路	神崎13	1982	5.00	23.80	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
59	播但連絡道路	神崎14	1982	2.70	23.80	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
60	播但連絡道路	神崎16	1982	4.90	19.30	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
61	播但連絡道路	神崎18	1982	2.70	10.50	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
62	播但連絡道路	神崎20	1982	2.70	10.50	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
63	播但連絡道路	神崎22	1982	2.70	10.25	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
64	播但連絡道路	神崎24	1982	15.30	10.30	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅲ		●							●				R6点検Ⅲ判定(R7修繕)
65	播但連絡道路	神崎27	1982	5.10	10.50	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
66	播但連絡道路	神崎32	1982	5.92	10.78	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
67	播但連絡道路	神崎36	1982	5.00	10.25	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
68	播但連絡道路	神崎39	1982	13.90	10.60	神河町	R1年度	Ⅰ	R6年度	Ⅰ		●											
69	播但連絡道路	神崎41	1982	2.70	10.50	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
70	播但連絡道路	神崎42	1982	7.20	10.57	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
71	播但連絡道路	神崎44	1982	2.70	13.48	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
72	播但連絡道路	神崎47	1982	12.00	21.10	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅲ		●							●				R6点検Ⅲ判定(R7修繕)
73	播但連絡道路	神崎49	1982	2.70	13.80	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
74	播但連絡道路	神崎50	1982	5.00	13.88	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
75	播但連絡道路	神崎51	1982	2.00	23.75	神河町	R1年度	Ⅰ	R6年度	Ⅰ		●											
76	播但連絡道路	神崎52	1982	2.70	12.07	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
77	播但連絡道路	神崎54	1982	5.80	10.54	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅲ		●							●				R6点検Ⅲ判定(R7修繕)
78	播但連絡道路	神崎56	1982	3.00	17.80	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
79	播但連絡道路	神崎66	不明	2.00	24.60	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
80	播但連絡道路	神崎67	1988	6.00	15.00	神河町	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
81	播但連絡道路	生野１	不明	5.21	11.50	朝来市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
82	播但連絡道路	生野15	1999	2.00	15.30	朝来市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
83	播但連絡道路	朝来４	1999	10.60	28.00	朝来市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
84	播但連絡道路	朝来７	1999	8.60	68.70	朝来市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
85	播但連絡道路	和田山３	1998	6.50	17.56	朝来市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
86	播但連絡道路	和田山13	1998	7.00	23.40	朝来市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
87	播但連絡道路	和田山17	1998	2.50	51.00	朝来市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
88	遠阪ﾄﾝﾈﾙ	遠阪１	2005	2.50	43.80	丹波市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
89	遠阪ﾄﾝﾈﾙ	遠阪３	2005	5.50	18.40	丹波市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									

（※）点検計画及び修繕計画について、●：実施済、○：実施予定を示す
（※）定期点検の結果により、対象施設及び修繕年次を適宜見直す

[個別施設計画]

点検計画・修繕計画【大型ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ】

令和８年９月時点

番号	路線名	名称	建設年次	橋長（m）	幅員（m）	場所	点検記録				点検計画						修繕計画						備考
							２巡目(R1～R5)		３巡目(R6～R10)		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
							点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分													
1	播但連絡道路	大塩別所Cランプボックス	1978	42.0	17.0	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
2	播但連絡道路	花田AB BOXトンネル	1978	42.0	17.0	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
3	播但連絡道路	御蔭BOXトンネル	1978	84.0	11.5	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
4	播但連絡道路	市川15	1974	51.6	10.5	市川町	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○		●					
5	播但連絡道路	朝来６	1999	19.0	6.9	朝来市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
6	播但連絡道路	和田山２	1998	56.4	10.6	朝来市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●											
7	播但連絡道路	和田山６	1998	38.1	9.0	朝来市	R1年度	Ⅲ	R6年度	Ⅱ		●											R1点検Ⅲ判定(R3修繕)
8	播但連絡道路	和田山８	1998	56.4	10.6	朝来市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
9	播但連絡道路	和田山15	1998	38.1	9.0	朝来市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										

(※)点検計画及び修繕計画について、●：実施済、○：実施予定を示す
(※)定期点検の結果により、対象施設及び修繕年次を適宜見直す

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画【トンネル】

令和８年９月時点

番号	路線名	トンネル名	建設年次	延長 (m)	場所	点検記録				点検計画						修繕計画						備考
						２巡目(R1～R5)		３巡目(R6～R10)		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
						点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分													
1	播但連絡道路	播但第１トンネル	1975	760.0	福崎町	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
2	播但連絡道路	播但トンネル	1992	716.4	神河町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
3	播但連絡道路	生野トンネル	1992	1,234.0	朝来市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
4	播但連絡道路	森垣トンネル	1992	388.0	朝来市	R4年度	Ⅱ	R9年度						○								
5	播但連絡道路	西山トンネル	1992	541.0	朝来市	R3年度	Ⅱ	R8年度					○									
6	播但連絡道路	朝来第１トンネル	2000	245.0	朝来市	R4年度	Ⅱ	R9年度						○								
7	播但連絡道路	朝来第２トンネル	2000	1,132.0	朝来市	R4年度	Ⅱ	R9年度						○								
8	播但連絡道路	朝来第３トンネル	2000	315.0	朝来市	R4年度	Ⅱ	R9年度						○								
9	播但連絡道路	朝来第４トンネル	2000	739.0	朝来市	R4年度	Ⅱ	R9年度						○								
10	播但連絡道路	朝来第５トンネル	2000	638.0	朝来市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○								
11	播但連絡道路	朝来第６トンネル	2000	357.0	朝来市	R5年度	Ⅲ	R10年度		●					○		●					R5点検Ⅲ判定(R6修繕)
12	播但連絡道路	朝来第７トンネル	2000	507.0	朝来市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
13	播但連絡道路	朝来第８トンネル	2000	356.0	朝来市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
14	播但連絡道路	朝来第９トンネル	2000	422.0	朝来市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
15	播但連絡道路	城山トンネル	2000	644.0	朝来市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
16	遠阪ﾄﾝﾈﾙ	遠阪トンネル	1977	2,585.0	丹波市	R1年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ		●								○			R8大規模修繕更新

(※)点検計画及び修繕計画について、●：実施済、○：実施予定を示す
(※)定期点検の結果により、対象施設及び修繕年次を適宜見直す

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画【横断歩道橋】

令和８年９月時点

番号	路線名	名称	建設年次	橋長 (m)	幅員 (m)	場所	点検記録				点検計画						修繕計画						備考
							２巡目(R1～R5)		３巡目(R6～R10)		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
							点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分													
1	播但連絡道路	花田料金所歩道橋	1999	169.0	1.0	姫路市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							
2	播但連絡道路	朝来サービスエリア歩道橋	1999	47.0	3.0	朝来市	R5年度	Ⅱ	R10年度		●					○							

(※)点検計画及び修繕計画について、●：実施済、○：実施予定を示す
(※)定期点検の結果により、対象施設及び修繕年次を適宜見直す

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画【門型標識】

令和８年９月時点

番号	路線名	名称	建設年次	幅員（m）	距離標（キロポスト）	場所	点検記録				点検計画						修繕計画						備考
							２巡目(R1～R5)		３巡目(R6～R10)		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
							点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分													
1	播但連絡道路	道路標識	1985	8.0	1.0	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
2	播但連絡道路	道路標識	1985	16.0	1.2	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
3	播但連絡道路	道路標識	1981	19.0	4.7	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
4	播但連絡道路	道路標識	1973	8.0	10.2	姫路市	R2年度	Ⅰ	R7年度	Ⅰ			●										
5	播但連絡道路	道路標識	1973	8.0	11.2	姫路市	R2年度	Ⅰ	R7年度	Ⅲ			●							○			R7点検Ⅲ判定(R8修繕)
6	播但連絡道路	道路標識	2002	8.0	15.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅲ			●							○			R7点検Ⅲ判定(R8修繕)
7	播但連絡道路	道路標識	2002	8.0	15.8	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅲ			●							○			R7点検Ⅲ判定(R8修繕)
8	播但連絡道路	道路標識	2002	8.0	16.1	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●							○			
9	播但連絡道路	道路標識	1973	7.5	16.3	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅲ			●							○			R7点検Ⅲ判定(R8修繕)
10	播但連絡道路	道路情報提供装置	1973	8.0	10.5	姫路市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
11	播但連絡道路	道路標識	1973	7.5	16.9	福崎町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅲ			●							○			R8年度撤去
12	播但連絡道路	道路標識	1975	7.5	20.9	市川町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅲ			●							○			R8年度撤去
13	播但連絡道路	道路標識	1975	7.5	22.4	市川町	R2年度	Ⅱ												○			R8年度撤去
14	播但連絡道路	道路標識	1975	7.5	23.2	市川町	R2年度	Ⅱ												○			R8年度撤去
15	播但連絡道路	道路標識	1975	10.0	24.2	市川町	R2年度	Ⅱ	R8年度					○									
16	播但連絡道路	道路標識	1975	10.0	26.5	市川町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅲ			●							○			R7点検Ⅲ判定(R8修繕)
17	播但連絡道路	道路標識	1975	10.0	27.8	市川町	R2年度	Ⅱ	R8年度					○									
18	播但連絡道路	道路標識	2004	10.0	30.6	神河町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅲ			●							○			R7点検Ⅲ判定(R8修繕)
19	播但連絡道路	道路標識	1982	10.0	35.6	神河町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅲ			●							○			R7点検Ⅲ判定(R8修繕)
20	播但連絡道路	道路標識	1992	10.0	39.1	神河町	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
21	播但連絡道路	道路標識	1992	10.0	45.4	朝来市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
22	播但連絡道路	道路標識	2000	14.0	47.0	朝来市	R2年度	Ⅰ	R7年度	Ⅱ			●										
23	播但連絡道路	道路標識	2000	14.0	63.3	朝来市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
24	播但連絡道路	道路情報提供装置	1992	10.5	42.5	朝来市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
25	遠阪ﾄﾝﾈﾙ	道路標識	2006	12.0	42.8	朝来市	R2年度	Ⅱ	R7年度	Ⅱ			●										
26	遠阪ﾄﾝﾈﾙ	道路標識	2006	10.0	42.0	朝来市	R2年度	Ⅱ	R8年度					○									

（※）点検計画及び修繕計画について、●：実施済、○：実施予定を示す
（※）定期点検の結果により、対象施設及び修繕年次を適宜見直す

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画【舗装】

令和８年９月時点

番号	路線名	名称	修繕延長 (km)	車　線	点検実施年度		点検計画						修繕計画						備考
					前々回	前回	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
1	播但連絡道路	舗装	56.4	全線	R2年度	R7年度			●				●	●	●	○	○	○	
2	遠阪トンネル	舗装	1.7	全線	R2年度	R7年度			●							○	○		

(※)トンネル・コンクリート舗装区間は除く

(※)点検計画及び修繕計画について、●：実施済、○：実施予定を示す

(※)定期点検の結果により、対象施設及び修繕年次を適宜見直す

［個別施設計画］

点検計画・修繕計画【設備】

令和８年９月時点

番号	路線名	施設名	数量	単位	点検計画						修繕（更新）計画						備考
					R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
1	播但連絡道路	道路照明灯	1,007	灯									●				LED化
2	播但連絡道路	トンネル照明灯	2,628	灯												○	LED化
3	播但連絡道路	道路情報板・表示板	41	基								●	●				
4	播但連絡道路	料金収受機械	17	箇所							●	●	●	○	○	○	箇所は料金所数
5	播但連絡道路	ETC設備	17	箇所							●	●			○	○	〃
6	播但連絡道路	ITV設備	15	箇所							●	●	●				
7	遠阪トンネル	道路照明灯	48	灯													
8	遠阪トンネル	トンネル照明灯	904	灯												○	LED化
9	遠阪トンネル	道路情報板・表示板	4	基									●				
10	遠阪トンネル	料金収受機械	1	箇所													箇所は料金所数
11	遠阪トンネル	ETC設備	1	箇所													〃
12	遠阪トンネル	ITV設備	17	箇所									●				

【日常点検:1回/1週】

【通常点検:1回/1ヵ月】

【定期点検:
1回/半年もしくは1年】

（分解整備）
※過去の整備記録を参考に
定期点検の結果から判断

(※)点検計画及び修繕計画について、●：実施済、○：実施予定を示す
(※)定期点検の結果により、対象施設及び修繕年次を適宜見直す
